

さいたま都市計画事業土呂農住特定土地区画整理事業

【地区の概要】

面積(ha)	11.1	施行者	さいたま市土呂農住特定土地区画整理組合	理事長	新見 全啓
都市計画決定告示日	平成3年3月28日	最新事業計画公告日	平成27年3月31日(第8回)	施行期間	H4~H32
当初事業計画公告日	平成4年8月28日			補助期間	H4~H31

減歩率(%)	25.94
公共減歩(%)	23.25
保留地減歩(%)	2.69

権利者数(人)	83
所有者数(人)	78
借地権者(人)	5

全建物戸数(戸)	44
要移転戸数(戸)	34
移転率(%)	77.3

DID区分	S50
地区計画	○
土地利用計画	住宅系
中心市街地活性化基本計画	—

生産緑地(m ²)	3,400
-----------------------	-------

計画人口(人)	660
人口密度(人/ha)	60

公共用地率(%)	整理前	9.40
	整理後	30.47

【公共施設整備の概要】

	幅員(m)	延長(m)	舗装完了延長(m)	路盤完了延長(m)	整備率(%)
都市計画道路	18~28.6	469.8	0.0	0.0	0.0
区画街路	2.5~10.0	2,824.5	770.4	847.0	27.3
特殊街路	4~10	453.2	135.0	185.0	29.8
駅前広場	—			駅前広場面積(m ²)	0.0
その他公共施設					—

公園面積(m ²)	3,350.9
公園箇所数	3
調整池面積(m ²)	836.4
調整池箇所数	1
電線類地中化	—

【資金計画】

(費目名は旧名称) (単位:千円)

総事業費	4,316,000	基本事業費等内訳	
基本事業費等	1,127,000	通常費	97,000
その他の国庫補助	0	交付金	1,030,000
地特A(都計道設定)	216,000	住宅基盤	0
地特B(区画街路設定)	0		
保留地処分金	430,781		
公管金	0	その他の国庫補助内訳	
助成金	2,541,890	都再区	0
賦課金	0	旧まち交	0
その他(配当金等)	329	関連事業	0
		効果促進事業	0

【事業の進捗状況(平成29年3月31日現在)】

総事業費進捗率	54.8 %
基本事業費進捗率	25.2 %
公共施設整備費進捗率	41.7 %
建物移転費進捗率	65.5 %
建物移転済戸数	29 戸
移転戸数進捗率	85.3 %


特徴的な制度等	—
---------	---

【仮換地指定等の状況】

仮換地指定率	100.0 %		
使用収益開始率	7.7 %		
仮換地指定日	当初	平成6年6月24日	(一括指定)
	最新	平成6年6月24日	(1回)

公共施設管理者負担金対象施設

公共施設名称	公共施設管理者担当課所

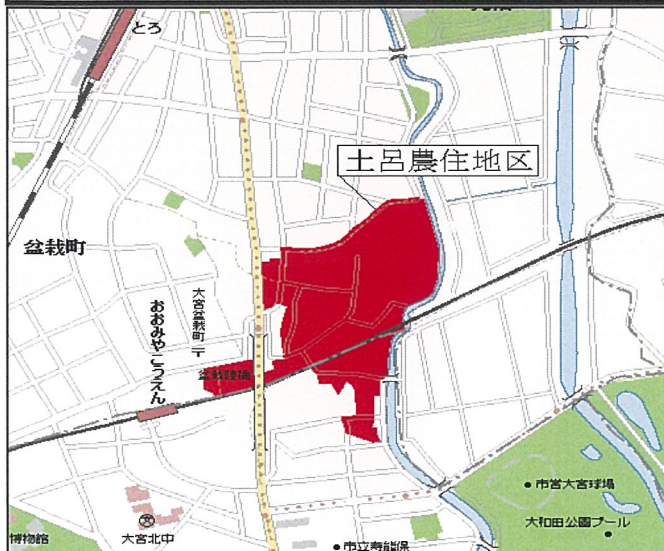

【保留地処分状況】

	面積(m ²)	画地数	処分率(%)
保留地全体	2,710.0	7	—
処分済保留地	0.0	0	0.0 %
うち一般保留地	0.0	0	0.0 %
うち特別保留地	0.0	0	0.0 %

【組合設立認可時同意率】

	人数(人)	%	面積(m ²)	%
権利者	50	96.2	94,861	99.4
所有者	46	95.8	93,761	99.4
借地権者	4	100.0	1,100	100.0

【問い合わせ先】

事務所名	(一財)さいたま市土地区画整理協会		
TEL	048-823-5221	FAX	048-824-7254
住所	さいたま市中央区下落合2丁目18番6号		
E-mail	kanrika@saitama-kukaku.jp		

最寄り駅からの距離 | 東武野田線大宮公園駅より0.5km
